

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **AB – STAV, s.r.o.**
Sídlo: 951 07 Malý Cetín 157
IČO: 36548707
DIČ: 2020154246
IČ DPH: SK2020154246
Zápis: OR Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vl. č. 13387/N
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Zastúpený: Ing. Dávid Borbély, konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Malý Cetín**
Sídlo: Malý Cetín 105, 951 07 Malý Cetín
IČO: 00 611 166
DIČ: 2021269657
IČ DPH: -
Zápis: -
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK27 5600 0000 0008 4494 4001
Zastúpený: Leonidas Charizopulos, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

Josef Szusztor
tel. č. 0903 429394
e-mail : josef.szusztor@gmail.com
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Výstavba tanečného altánku v obci Malý Cetín (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - Výstavba tanečného altánku (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela z finančného príspevku z fondov Európskej únie, o ktorý požiadal a ktorého poskytnutie mu bolo schválené. Vyplatenie príspevku je však naviazané na podmienku preukázania realizácie a dokončenia Diela, vrátane jeho kolaudácie.
- 3.2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo ako celok zrealizuje (ukončí) riadne a včas bez väd najneskôr do 31.3.2025.**
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. **Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy pred začatím realizácie diela bez udania dôvodu,** najmä ak dôjde k zrušeniu schválenia jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na realizáciu Diela.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

| | |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 58 167,19 |
| DPH | 11 633,44 |
| Cena s DPH | 69 800,63 |

Ide o konečnú cenu, ktorá zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. Objednávateľ zaplatí cenu Diela Zhotoviteľovi po **riadnom a včasnom vykonaní a odovzdaní celého Diela bez väd.** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po splnení uvedených podmienok.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúry je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Po vystavení faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a

písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ sa oboznámi a prezrie si Dielo a dokumentáciu pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo

vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.

- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. **SANKCIE**

- 7.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ nemá možnosť financovať realizáciu Diela z vlastných zdrojov, Objednávateľ má možnosť financovať realizáciu Diela iba z finančného príspevku z fondov Európskej únie, o ktorý požiadal a ktorého poskytnutie mu bolo schválené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Samotné vyplatenie príspevku je však naviazané na podmienku, že najneskôr do 12 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. do 30.6.2025, podľa toho čo nastane skôr bude Objednávateľom podaná na PPA tzv. žiadosť o platbu príspevku, ktorou musí Objednávateľ preukázať aj zrealizovanie a dokončenie Diela, vrátane jeho kolaudácie. V prípade že do uvedeného termínu nebude takáto žiadosť o platbu (vrátane preukázania dokončeného Diela) podaná, Objednávateľovi nebude vyplatený žiadny príspevok, čím Objednávateľ stratí možnosť Dielo financovať. Preto je pre Objednávateľa dôležité, aby Dielo bolo vykonané riadne do termínu stanoveného v bode 3.2. tejto Zmluvy.
- 7.2. Zmluvné strany sa preto dohodli, že ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas.
- 7.3. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne a včas, bude Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z tohto dôvodu, platia zákonné ustanovenia o povinnosti vydať si navzájom už poskytnuté plnenia (podľa § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka), avšak Objednávateľ nebude povinný poskytnúť Zhotoviteľovi žiadnu peňažnú náhradu v prípadoch ak nebude možné z akéhokoľvek (najmä technického) dôvodu vrátiť Zhotoviteľovi samotné plnenie (Dielo).
- 7.4. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.5. **Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak poruší svoju povinnosť realizovať a preukázať plnenie sociálneho aspektu, na plnenie ktorého sa zaviazal v tomto zmluvnom vzťahu a Poskytovateľ pomoci uloží Objednávateľovi finančnú sankciu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške uloženej finančnej sankcie;**
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej

porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

(tzv. doložka plnenia zmluvy týkajúca sa uplatnenia sociálneho aspektu)

- 8.1. Objednávateľ je v súvislosti s plnením predmetnej Zmluvy povinný uplatňovať sociálny aspekt.
- 8.2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa vyžaduje uplatňovať sociálny aspekt so zameraním na oblasť: **Dôstojné pracovné podmienky**, s vplyvom na **Zabezpečenie dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“)** nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti.
- 8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetnej zmluvy **zabezpečí dodržiavanie BOZP nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti**.
- 8.4. **Zhotoviteľovi sa dáva za povinnosť vypracovať a predložiť dokumentáciu BOZP špecifickú pre predmet plnenia zmluvy, ktorá bude obsahovať minimálne jedno opatrenia BOZP, ktoré je nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti v tejto oblasti.**
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný túto dokumentácia BOZP špecifickú pre predmet plnenia zmluvy, so zapracovaným opatrením/opatreniami BOZP nad rámec zákonom vyžadovaných povinností, predložiť Objednávateľovi ku dňu podpisu tejto Zmluvy o dielo.
- 8.6. Predložená dokumentácia BOZP podľa bodu vyššie, musí byť spracovaná autorizovanou osobou v oblasti ochrany práce a BOZP. Táto autorizovaná osoba navrhne a zapracuje najvhodnejšie opatrenie / opatrenia BOZP nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti, a zodpovedá za ich relevantnosť z titulu svojej odbornosti. **V predloženej dokumentácii BOZP musí byť jasne identifikované, ktoré opatrenie/opatrenia sú vyžadované nad rámec zákonnej povinnosti.**
- 8.7. Zhotoviteľ je ďalej povinný pri odovzdaní diela odovzdať Objednávateľovi aj **dôkazy preukazujúce, že reálne došlo k naplneniu ním navrhovaného opatrenia/opatrení BOZP počas plnenia tejto zmluvy o dielo.** Predložené dôkazy musia jednoznačne preukazovať, že reálne došlo s naplnením vyššie uvedeného sociálneho aspektu.
- 8.8. Objednávateľ je pri plnení tejto Zmluvy povinný uplatňovať sociálny aspekt, a zároveň je povinný Poskytovateľovi pomoci (PPA) **preukázať naplnenie sociálneho aspektu.** V prípade nenaplnenia sociálneho aspektu môže Poskytovateľ pomoci (PPA) uplatniť voči Objednávateľovi finančnú sankciu (**finančná oprava vo výške 25% NFP**).
- 8.9. **Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak poruší svoju povinnosť realizovať a preukázať plnenie sociálneho aspektu, na plnenie ktorého sa zaviazal v tomto zmluvnom vzťahu a Poskytovateľ pomoci uloží Objednávateľovi finančnú sankciu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške uloženej finančnej sankcie.**
- 8.10. Vyššie popísané podmienky sa týkajú len plnenia tejto konkrétnej Zmluvy a musia byť zabezpečené minimálne počas celej doby plnenia tejto Zmluvy.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet dodania je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako

konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom dodania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy, a výsledky administratívnej finančnej kontroly, ktoré vykoná orgán poskytujúci nenávratný finančný príspevok, neumožnia použiť žiadaný nenávratný finančný príspevok na financovanie predmetu diela podľa tejto zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú osoby, ktoré sú ako oprávnené osoby na túto činnosť uvedené v predpisoch upravujúcich žiadanie a poskytovanie nenávratného finančného príspevku a v Zmluve o NFP.

- 9.3. Za oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sa považujú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
 - g) odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF;
- 9.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.6. Počas doby platnosti a účinnosti Zmluvy o plnení zákazky nemôže dôjsť k žiadnej zmene (dodatkom alebo jednostranne) tých častí Zmluvy o plnení zákazky, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle Hodnotiacich kritérií v procese obstarávania predmetu Zmluvy.
- 9.7. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Pri povinne zverejňovaných zmluvách je účinnosť zmluvy naviazaná na jej zverejnenie. Každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle Obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak Obstarávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.
- 9.8. Keďže na financovanie predmetu dodania podľa tejto Zmluvy žiada Objednávateľ nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie (ďalej len „Žiadosť“), teda Objednávateľ má záujem realizovať predmet diela podľa tejto Zmluvy zo zdrojov získaných Žiadosťou, vyhradzuje si Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak nedôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na základe podanej Žiadosti, alebo ak nebude zo strany orgánu poskytujúceho nenávratný finančný príspevok schválené verejné obstarávanie pre obstaranie predmetu dodania podľa tejto Zmluvy bez výhrad.
- 9.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa registrovať v registri partnerov verejného sektora za podmienok podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ prehlasuje, že je v súvislosti s touto Zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť podľa zákona vznikla a zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri aspoň po dobu trvania zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej ujmy, ktorú Objednávateľ bude musieť v súvislosti s porušením povinnosti registrácie Zhotoviteľa v uvedenom registri, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť príspevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa voči Zhotoviteľovi náhrady škody v celom rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

- 9.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.11. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 9.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č.1 – Položkový rozpočet / Výkaz-výmer

Príloha č.2 – Podmienky využitia subdodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z.

Príloha č.3 – V súvislosti s osobitnými podmienkami plnenia Zmluvy: Dokumentáciu BOZP špecifická pre predmet plnenia Zmluvy, ktorá bude obsahovať minimálne jedno opatrenia BOZP, ktoré je nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti v tejto oblasti

Príloha č. 4 – Harmonogram postupu prác

Za Zhotoviteľa:

V Malom Cetíne, dňa 03.09.2024.

Za Objednávateľa:

v *Malom Cetíne*, dňa *06.09.2024*

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KA240624
Stavba: /Rekonštrukcia / Modernizácia detského ihriska a výstavba tanečného altánku,
Malý Cetín, p.č.128/1, 133/1

JKSO: Malý Cetín p.č.128/1, 133/1

KS: 16. 8. 2024

Objednávateľ:
Obec Malý Cetín

IČO: 00611166
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AB-STAV s r.o., Malý Cetín

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

Projektant:
DANVI s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Katarína Andrásková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 58 167,19 |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | 58 167,19 | 11 633,44 |
| Cena s DPH v EUR | | | 69 800,63 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AB-STAV, s.r.o.
351 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707


Poznámka : Príjmové údaje sú uvedené EUR.

42166,1

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KA240624
Stavba: /Rekonštrukcia / Modernizácia detského ihriska a výstavba tanečného altánku,
Malý Cetín, p.č.128/1, 133/1
Miesto: Malý Cetín p.č.128/1, 133/1 Dátum: 16. 8. 2024
Objednávateľ: Obec Malý Cetín Projektant: DANVI s.r.o.
Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín Spracovateľ: Katarína Andrasková

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 58 167,19 | 69 800,63 |
| 01. | 01 - SO-01 Výstavba tanečného altánku v obci Malý Cetín - hrubá stavba | 42 967,81 | 51 561,37 |
| 02. | Zelená infraštruktúra v obci Malý Cetín | 15 199,38 | 18 239,26 |

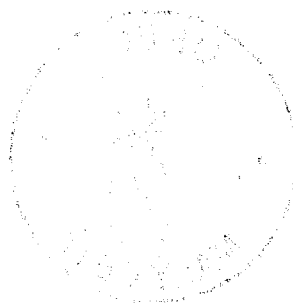

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

/Rekonštrukcia / Modernizácia detského ihriska a výstavba tanečného altánku, Malý Cetín, p.č.128/1, 133/1

Objekt:

01. - 01 - SO-01 Výstavba tanečného altánku v obci Malý Cetín - hrubá stavba

JKSO:

Miesto: Malý Cetín p.č.128/1, 133/1

KS:

Dátum: 16. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Malý Cetín

IČO:

00611166

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

DANVI s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 967,81

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 42 967,81 | 20,00% | 8 593,56 |

Cena s DPH

v EUR

51 561,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

/Rekonštrukcia / Modernizácia detského ihriska a výstavba tanečného altánku, Malý Cetín, p.č.128/1, 133/1

Objekt:

01. - 01 - SO-01 Výstavba tanečného altánku v obci Malý Cetín - hrubá stavba

Miesto:

Malý Cetín p.č.128/1, 133/1

Dátum:

16. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Malý Cetín

Projektant:

DANVI s.r.o.

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 967,81

HSV - Práce a dodávky HSV

11 342,40

1 - Zemné práce

437,02

2 - Zakladanie

1 422,18

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 495,25

4 - Vodorovné konštrukcie

6 962,74

99 - Presun hmôt HSV

1 025,21

PSV - Práce a dodávky PSV

31 625,41

762 - Konštrukcie tesárske


16 799,98

764 - Konštrukcie klampiarske

3 082,99

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

11 742,44



ROZPOČET

Stavba: /Rekonštrukcia / Modernizácia detského ihriska a výstavba tanečného altánku, Malý Cetín, p.č.128/1, 133/1

Objekt: **01. - 01 - SO-01 Výstavba tanečného altánku v obci Malý Cetín - hrubá stavba**

Miesto: Malý Cetín p.č.128/1, 133/1

Dátum: 16. 8. 2024

Objednávateľ: Obec Malý Cetín

Projektant: DANVI s.r.o.

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ: Katarína Andrasková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 42 967,81 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 11 342,40 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 437,02 |
| 1 | K | 133101201.S | Výkop pätky nezapaženej, hornina 1a2 do 100 m3 | m3 | 11,200 | 39,02 | 437,02 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 1 422,18 |
| 2 | K | 275313611.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 11,200 | 126,98 | 1 422,18 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 1 495,25 |
| 3 | K | 331270521.S | Murivo pilierov a stlpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20 | m3 | 3,780 | 236,16 | 892,68 |
| 4 | K | 331361821.S | Výstuž stlpov, pilierov z DBT , hranatých z bet. ocele B500 (10505) | t | 0,292 | 2 063,60 | 602,57 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 6 962,74 |
| 5 | K | 413321315.S | Betón nosníkov, prievlakov železový tr. C 20/25 | m3 | 8,937 | 149,51 | 1 336,17 |
| 6 | K | 413351107.S | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 87,750 | 27,00 | 2 369,25 |
| 7 | K | 413351108.S | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 87,750 | 6,77 | 594,07 |
| 8 | K | 413351213.S | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie | m2 | 28,170 | 27,64 | 778,62 |
| 9 | K | 413351214.S | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie | m2 | 28,170 | 7,45 | 209,87 |
| 10 | K | 413361821.S | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 0,890 | 1 881,75 | 1 674,76 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 1 025,21 |
| 11 | K | 998011001.S | Presun hmôt vnútrostaveniskový pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 53,313 | 19,23 | 1 025,21 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 31 625,41 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 16 799,98 |
| 12 | K | 713191121.S | Lepenka A400/H položená na sucho | m2 | 29,790 | 4,79 | 142,69 |
| 13 | K | 763732112.R | Drevený krov z impregnovaných priehradových väzníkov vrátane kotviacich prvkov a príp. pomúrníc (výmera - vodorovná , nie rozvinutá plocha) dodávka a montáž | m2 | 217,000 | 31,79 | 6 898,43 |
| 14 | K | 762341003.S | Montáž plného debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek drevených | m2 | 241,000 | 6,40 | 1 542,40 |
| 15 | K | 762341031.S | Montáž debnenia štítových stien z dosiek pre všetky druhy striech | m2 | 19,125 | 19,23 | 367,77 |
| 16 | M | 611920007000.S | Drevené dosky impregnované smrek/jedľa ohoblované - dodávka | m2 | 280,935 | 14,56 | 4 090,41 |
| 17 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 884,000 | 1,66 | 1 467,44 |
| 18 | K | 762341252.S | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 246,000 | 1,66 | 408,36 |
| 19 | M | 605430000203.S | Laty drevené impregnované smrek/jedľa 40x60mm - dodávka | m3 | 2,983 | 388,55 | 1 159,04 |
| 20 | K | 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 160,765 | 4,50 | 723,44 |
| D | 764 | | Konštrukcie klampiarske | | | | 3 082,99 |
| 21 | K | 764352427.R | Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. do 330 mm | m | 51,200 | 36,86 | 1 887,23 |
| 22 | K | 764359412.S | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm | ks | 6,000 | 30,64 | 183,84 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 764454454.R | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer do 120 mm | m | 21,000 | 45,52 | 955,92 |
| 24 | K | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 30,270 | 1,85 | 56,00 |
| | D | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 11 742,44 |
| 25 | K | 765334209.R | Pálená krytina hladká, (nie bobrovka) jednoduchých striech, sklon do 35° | m2 | 241,000 | 30,14 | 7 263,74 |
| 26 | K | 765901126.R | Strešná fólia hydroizolačná poistná na plné debnenie | m2 | 241,000 | 16,00 | 3 856,00 |
| 27 | K | 998765201.S | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 111,197 | 5,60 | 622,70 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

/Rekonštrukcia / Modernizácia detského ihriska a výstavba tanečného altánku, Malý Cetín, p.č.128/1, 133/1

Objekt:

02. - Zelená infraštruktúra v obci Malý Cetín

JKSO:

Miesto: Malý Cetín

KS:

Dátum: 16. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Malý Cetín

IČO:

00611166

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav Kočajda

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 199,38

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 15 199,38 | 20,00% | 3 039,88 |

Cena s DPH

v EUR

18 239,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AB-STAV, s.r.o.
051 07 MALÝ CETÍN

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

/Rekonštrukcia / Modernizácia detského ihriska a výstavba tanečného altánku, Malý Cetín, p.č.128/1, 133/1

Objekt:

02. - Zelená infraštruktúra v obci Malý Cetín

Miesto:

Malý Cetín

Dátum:

16. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Malý Cetín

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav
Kočajda

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 199,38

HSV - Práce a dodávky HSV

15 199,38

1 - Zemné práce

14 894,15

99 - Presun hmôt HSV

305,23



ROZPOČET

Stavba:

/Rekonštrukcia / Modernizácia detského ihriska a výstavba tanečného altánku, Malý Cetín, p.č.128/1, 133/1

Objekt:

02. - Zelená infraštruktúra v obci Malý Cetín

Miesto: Malý Cetín

Dátum: 16. 8. 2024

Objednávateľ: Obec Malý Cetín

Projektant: Ing. Arch. Rastislav Kočajda

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ: Katarína Andrasková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|---------------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 15 199,38 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 15 199,38 |
| D | 1 | Zemné práce | | | | | 14 894,15 |
| 1 | K | 180402111.S | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5 | m2 | 1 200,000 | 1,30 | 1 560,00 |
| 2 | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 37,080 | 10,61 | 393,42 |
| 3 | K | 183101111.S | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3 | ks | 59,000 | 2,25 | 132,75 |
| 4 | K | 183101214.S | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3 | ks | 13,000 | 15,60 | 202,80 |
| 5 | K | 183403114.S | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 200,000 | 0,62 | 744,00 |
| 6 | K | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 200,000 | 0,56 | 672,00 |
| 7 | K | 183403161.S | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 200,000 | 0,19 | 228,00 |
| 8 | K | 183410025.S | Vertikutácia trávnik plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 4 000,000 | 0,19 | 760,00 |
| 9 | K | 184102110.S | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm | ks | 59,000 | 2,00 | 118,00 |
| 10 | M | Pol5 | Tamariška štvortyčinková <i>Tamarix tetrandra</i> | ks | 3,000 | 8,15 | 24,45 |
| 11 | M | Pol6 | Hamamel prostredný <i>Hamamelis intermedia 'Jelena'</i> | ks | 5,000 | 16,22 | 81,10 |
| 12 | M | Pol7 | Drieň biely <i>Cornus alba 'Sibirica'</i> | ks | 6,000 | 5,74 | 34,44 |
| 13 | M | Pol8 | Drieň výbežkatý <i>Cornus stolonifera 'Flaviramea'</i> | ks | 4,000 | 6,36 | 25,44 |
| 14 | M | Pol9 | Orgován obyčajný <i>Syringa vulgaris 'Charles Joly'</i> | ks | 7,000 | 16,85 | 117,95 |
| 15 | M | Pol10 | Zlatovka prostredná <i>Forsythia intermedia 'Lynwood'</i> | ks | 6,000 | 3,12 | 18,72 |
| 16 | M | Pol11 | Vavrínovec lekárske <i>Prunus laurocerasus 'Otto luyken'</i> | ks | 11,000 | 7,66 | 84,26 |
| 17 | M | Pol12 | Budleja dávidova <i>Buddleja davidii 'Adonis blue'</i> | ks | 7,000 | 5,62 | 39,34 |
| 18 | M | Pol13 | Tavoľník nipoňský <i>Spiraea nipponica 'Snowmound'</i> | ks | 10,000 | 6,61 | 66,10 |
| 19 | K | 184102113.S | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm | ks | 13,000 | 10,92 | 141,96 |
| 20 | M | Pol1 | Lipa malolistá <i>Tilia cordata</i> | ks | 2,000 | 130,73 | 261,46 |
| 21 | M | Pol2 | Javor mliečny <i>Acer platanoides</i> | ks | 3,000 | 177,19 | 531,57 |
| 22 | M | Pol3 | Breza himalájska <i>Betula jacquemontii</i> | ks | 4,000 | 148,49 | 593,96 |
| 23 | M | Pol4 | Javor mliečny Krimson king <i>Acer platanoides 'Crimson king'</i> | ks | 4,000 | 169,70 | 678,80 |
| 24 | K | 184202111.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m | ks | 13,000 | 13,39 | 174,07 |
| 25 | M | 052170000500.S | Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2,5 m a viac bez kôry | ks | 40,000 | 13,23 | 529,20 |
| 26 | M | 605140000100.S | Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I | m3 | 0,050 | 948,33 | 47,42 |
| 27 | M | 309500000200.S | Skrutka kombi M 8x60 mm | ks | 156,000 | 0,11 | 17,16 |
| 28 | M | 708360000100.S | Popruhy viazacie šírky 30 mm, | m | 50,000 | 1,00 | 50,00 |
| 29 | K | 184816111.S | Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. | ks | 72,000 | 1,07 | 77,04 |
| 30 | M | 103710000100.S | Hnojivo tabletkové, doba pôsobenia 8 - 9 mesiacov, výdatnosť 30 - 50 g/m2 | kg | 0,780 | 23,96 | 18,69 |
| 31 | K | 184852010.S | Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom | m2 | 5 050,000 | 0,05 | 252,50 |
| 32 | M | 251110000100.S | Hnojivo NPK dusíkaté priemyselné v PE vreciach | t | 0,101 | 1 123,03 | 113,43 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 33 | K | 184921093.S | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 76,000 | 3,09 | 234,84 |
| 34 | M | 055410000100.S | Mulčovacia kôra | l | 7 000,000 | 0,10 | 700,00 |
| 35 | K | 184921111.S | Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 76,000 | 2,78 | 211,28 |
| 36 | M | 693710000200.S | Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2 | bal | 0,480 | 62,39 | 29,95 |
| 37 | K | 185803411.S | Vyhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 4 000,000 | 0,44 | 1 760,00 |
| 38 | K | 183901141.S | Doplnenie substrátu pri výsadbe drevín | m3 | 15,000 | 0,97 | 14,55 |
| 39 | M | 103210000100.S | Substrát záhradnícky big bag 1,5 m3, objemová hmotnosť 750 - 1450 kg/m3 | m3 | 15,000 | 9,73 | 145,95 |
| 40 | K | 891143015.S | Montáž zavlažovacích vakov | ks | 13,000 | 5,62 | 73,06 |
| 41 | M | 426810001000.S | Zavlažovací vak 75 L | ks | 13,000 | 13,73 | 178,49 |
| 42 | K | 185804311.S | Zalievanie rastlín vodou, plochy trávnik plošne, stromy a kry jednotlivo po dobu 1 mesiac | m3 | 100,000 | 24,07 | 2 407,00 |
| 43 | K | 185851111.S | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | m3 | 100,000 | 3,49 | 349,00 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 305,23 |
| 44 | K | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy, sadovnícky materiál | t | 4,167 | 73,25 | 305,23 |

Zmluva o dielo – Príloha č. 2:

Podmienky využitia subdodávateľov

Obchodné meno a sídlo uchádzača/Zhotoviteľa:

AB – STAV, s.r.o. 951 07 Malý Cetín 157

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnej súťaži pri zadávaní zákazky na predmet zákazky „**Obstarávanie stavebných prác – rekonštrukcia čerpacích staníc odpadových vôd v obci Malý Cetín**“, ktorú vyhlásila obec Malý Cetín ako verejný obstarávateľ (ďalej aj ako „Objednávateľ“) funkcionalitou elektronickej platformy UVO, systém EVO :

- v plnom rozsahu a bez obmedzenia súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži vrátane zmluvných podmienok a nižšie uvedených podmienok využitia subdodávateľov;
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Prehľad subdodávateľov

| Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt | Predmet subdodávok | Podiel subdodávok v % a v EUR |
|---|--------------------|-------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SPOLU | 0% |

Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.

1. Úspešný uchádzač (ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je oprávnený zveriť vykonanie časti predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie uvedeného prehľadu. Každý subdodávateľ, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, je povinný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
2. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi inému ako v uvedenom prehľade, je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti predmetu zmluvy.
4. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodať časť predmetu zmluvy, je povinný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

5. Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení Objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť predmetu zmluvy bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo neprevziať predmet plnenia.
6. Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok podľa vyššie uvedeného prehľadu a to zmenou podielu subdodávok pre už uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok, resp. doplnenia subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia časti predmetu zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.
8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,00 EUR bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Malom Cetíne, dňa 03.09.2024.

Meno štatutárneho orgánu uchádzača/Zhotoviteľa: Ing. Dávid Borbély

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača/Zhotoviteľa:.....


Príloha č. 3

AB - STAV, s.r.o., 951 07 Malý Cetín 157

PREVÁDZKOVÝ PREDPIS

„ SOCIÁLNE ASPEKTY U ZAMESTNÁVATEĽA“

Vypracoval: Ing. Tomáš Prehoda
technik BOZP a ABT
V Malom Cetíne , dňa 03.09.2024

Schválil: Ing. Dávid Borbéli
konateľ

Sociálne aspekty u zamestnávateľa

Zamestnávateľ bude počas celej doby realizácie projektu dodržiavať nasledovný sociálny aspekt uplatnený v rámci BOZP:

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov pitný režim je stanovená v § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Zabezpečí bezplatne väčšie množstvo balenej minerálnej vody pre každého zamestnanca počas celej doby realizácie projektu než predpisujú platné právne predpisy

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky je stanovená v § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zamestnávateľ poskytne bezplatne väčšie množstvo umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny než predpisujú platné právne predpisy

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť bezplatne pre svojich zamestnancov pracovný odev a pracovnú obuv je stanovená v § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi bezplatne väčšie množstvo pracovného odevu a pracovnej obuvi počas celej doby realizácie projektu než predpisujú platné právne predpisy

Harmonogram prác

Výstavba tanečného altánku v obci Malý Cetín

| | I. | | | II. | | | III. | | | |
|-------------------------|----|--|--|-----|--|--|------|--|--|--|
| Zemné práce | | | | | | | | | | |
| Zakladanie | | | | | | | | | | |
| Zvislé konštrukcie | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konštrukcie | | | | | | | | | | |
| Kontrukcie tesárske | | | | | | | | | | |
| Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | |
| Krytiny tvrdé | | | | | | | | | | |
| Zelená infraštruktúra | | | | | | | | | | |
